



INFORME DE GESTION

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2014

SEPTIEMBRE 2013



DICIEMBRE 2013



JUNIO 2014



Septiembre 2014



Asignación de subsidios para población en situación de desplazamiento.

Durante el tercer trimestre el año 2014 se han asignado tres (3) subsidios complementarios a población en víctima del conflicto residentes en la ciudad de Bucaramanga mediante resoluciones 556, 677 y 681 destinados a la construcción de vivienda nueva o usada.

Participación y atención a población desplazada y lo víctimas del conflicto armado.

Durante el tercer trimestre de 2014 se realizó un (1) comité de reparación integral a víctimas el día 11 de julio. Así mismo se realizó otro comité el día 26 de Agosto del presente año el cual está pendiente la aprobación del acta, en el siguiente comité que se realizará el próximo 9 de octubre del presente año.



Caracterización de poblaciones para estudios de proyectos de viviendas.

- Se han ejecutado tres (3) caracterizaciones socioeconómicas durante el tercer trimestre del presente año en cumplimiento del plan operativo 2014, a las familias que habitan en los asentamientos humanos, los cuales se relacionan a continuación:
- Sector Villa de Lina con 69 unidades habitacionales
- Sector Luz de Esperanza con 13 unidades habitacionales
- Sector CERVUNION con 105 unidades habitacionales



Asignación de subsidios para construcción de vivienda prioritaria a población en situación vulnerable – VIP GRATUITA

Para este trimestre se asignaron 614 Subsidios Familiares de Vivienda en especie a hogares con selección directa, en el marco del programa de Vivienda gratuita en el Proyecto Campo Madrid del municipio mediante Resolución No. 1614 del 15 de Septiembre de 2014 .

Entrega de viviendas

Durante el tercer trimestre del año 2014 se entregaron 98 viviendas del proyecto del Paseo la Feria IV etapa mediante actas de entrega



Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Fondo Nacional de Vivienda
República de Colombia

RESOLUCIÓN NÚMERO

(1614)

15 SET. 2014

"Por la cual se asignan seiscientos catorce (614) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en el proyecto Campo Madrid del municipio de Bucaramanga en el departamento de Santander".

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA



Mejoramientos de vivienda en zona rural.

El proyecto de mejoramiento de vivienda rural se encuentra en fase de desarrollo; es importante resaltar que ya se seleccionaron 200 familias que se beneficiaran de este subsidio para el mejoramiento de sus viviendas. El acto administrativo que reglamento la selección es el 609 del 31 de julio de 2014. El proyecto ya tiene se encuentra radicado en el banco de proyectos de planeación Municipal y cuenta con vigencia futura ordinaria aprobada. Actualmente esta en etapa contractual.

Asignación de subsidios para construcción de vivienda rural en sitio propio.

En la actualidad se han asignado subsidios para construcción de vivienda en sitio propio, bajo la resolución 466 del 27 de junio de 2014. Las 60 familias fueron seleccionadas por el Banco Agrario, en el proyecto denominado Construcción de Vivienda Nueva con Unidad Productiva (VIS-R), este proyecto fue gestionado con recursos del INVISBU y del Banco Agrario, y será ejecutado por la Caja de Compensación Familiar COMFENALCO quien figura como ente operador.

9. Presentación de la oferta institucional del INVISBU.

- Se atendieron 7.046 personas durante los meses de julio, agosto y septiembre cuyas listas de atención a la ciudadanía reposan actualmente en el archivo de Gestión de la Subdirección Operativa.
- Como parte de la socialización permanente de la oferta institucional del INVISBU, se ha difundido el contenido de los planes, programas y proyectos vigentes en los sectores rurales de la jurisdicción del municipio de Bucaramanga, en las comunas donde se ha solicitado la presencia del Instituto, y en los diferentes eventos de reparación a víctimas realizados por la alcaldía municipal.



GESTION SOCIAL



- Igualmente se esta realizando un proceso de psicoeducación a los beneficiarios del Proyecto Altos de Betania con profesionales del área de Psicología y Trabajo Social el cual consiste en un brindar educación e información con el objetivo de dotarlos de herramientas que les permitan ser más proactivos, modificando actitudes y conductas las cuales van a permitir la cohesión del tejido social de los 300 beneficiarios de este proyecto.



GESTION SOCIAL

- De igual forma se realizo el acompañamiento social a la convocatoria realizada en el coliseo Bicentenario por parte del ministerio de vivienda desde del día 19/08/2014 hasta 22/09/2014, orientando y brindando asesoría en todo o relacionado con esta postulación.



PROYECTO PASEO LA FERIA ETAPA IV

CANCHA LA FERIA Y EMPRADIZACION



- Se ha ejecutado la cancha en un 100% en un lote adyacente a la Etapa IV de La Feria, valor total de \$ 347.315.067

- La empradizacion cuenta con un avance de 30%, valor total de \$51.464.444



PROYECTO ALTOS DE BETANIA 270 aptos



- Se están construyendo 270 apartamentos con un avance aproximado de 70%.
- Se seleccionaron los 30 beneficiarios para la torre faltante.
- Atención a visitas de FONADE al proyecto como supervisor de subsidios asignados por FONVIVIENDA



Valor de Inversión
\$ 9.400.000.000

ENTREGA FINAL
FEBRERO 2015


Licencia de Urbanismo Actual

Modificación a la Licencia 68001-1-12-0278

Resol.073 del 13 de junio de 2013

CAMPO MADRID

Bucaramanga Santander Colombia

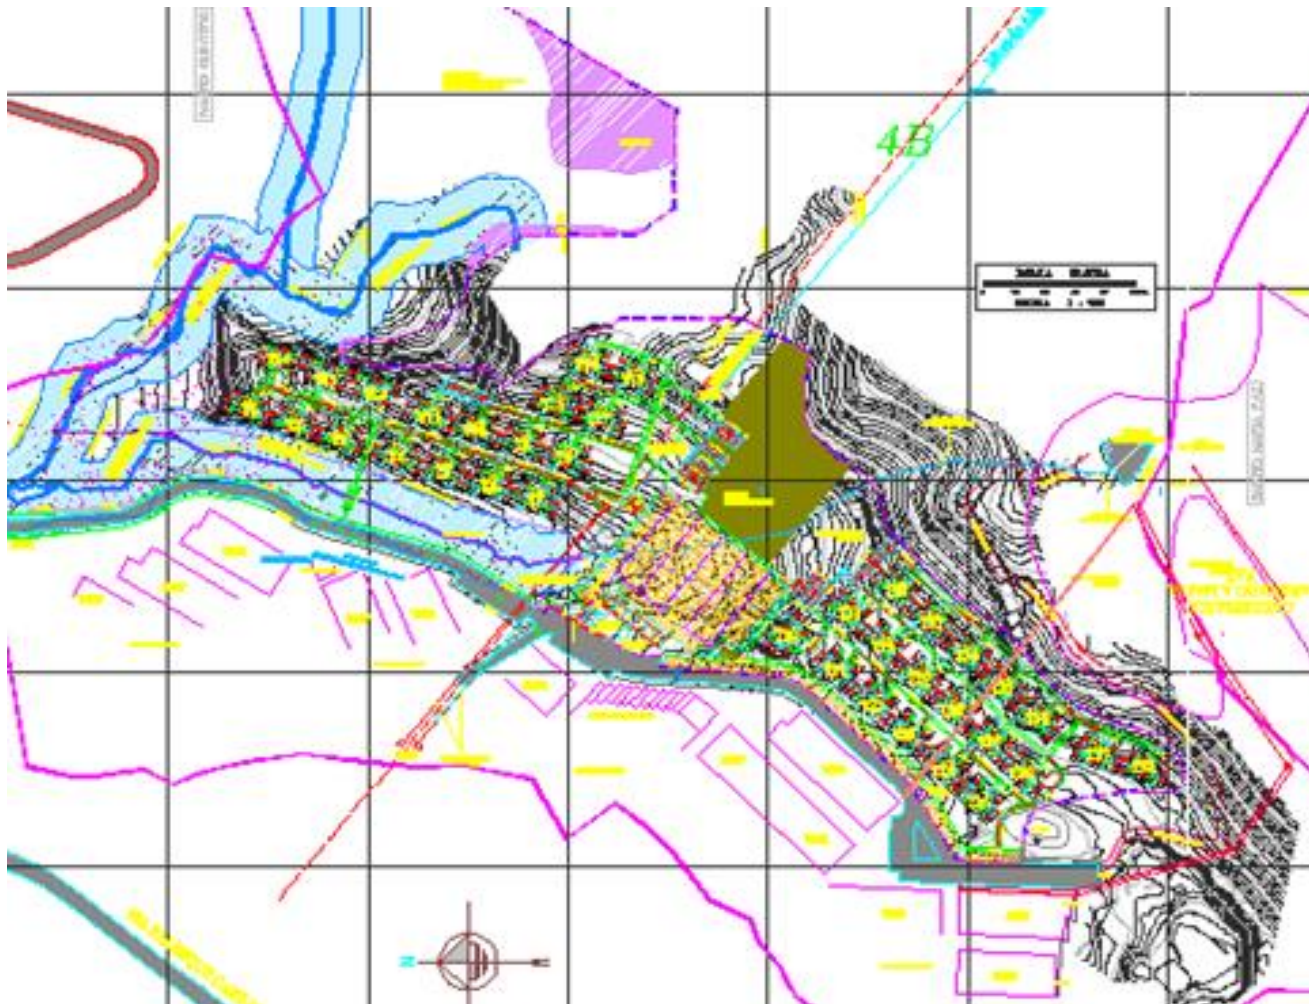

AVANCES

PROYECTO VIP CAMPO MADRID

41.1%

CONSTRUCCION DE LAS REDES DE
DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO PARA
ALIMENTAR EL PROYECTO VIP CAMPO
MADRID
(CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No
005/12)
VALOR DEL CONVENIO: \$ 1.947.630.337
AVANCE: 51.40 %

51,40%

CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO
SANITARIO PRINCIPAL Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL EXTERNO POR CANALIZACIÓN PARA
EL PROYECTO DE VIVIENDA CAMPO MADRID
(CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No
095/13)
VALOR DEL CONVENIO: 3.010.577.787
AVANCE: 63,20 %

63,20%

VIVIENDAS

1362 UNIDADES INICIALMENTE PROYECTADAS
1348 UNIDADES DEFINITIVAS AREA
EN ACABADOS ESTAN 148 APARTAMENTOS


Registro fotográfico



Licencia de Urbanismo Actual

Modificación a la Licencia 68001-1-13-0285
Resol.073 del 13 de junio de 2013

LA INMACULADA FASE 1

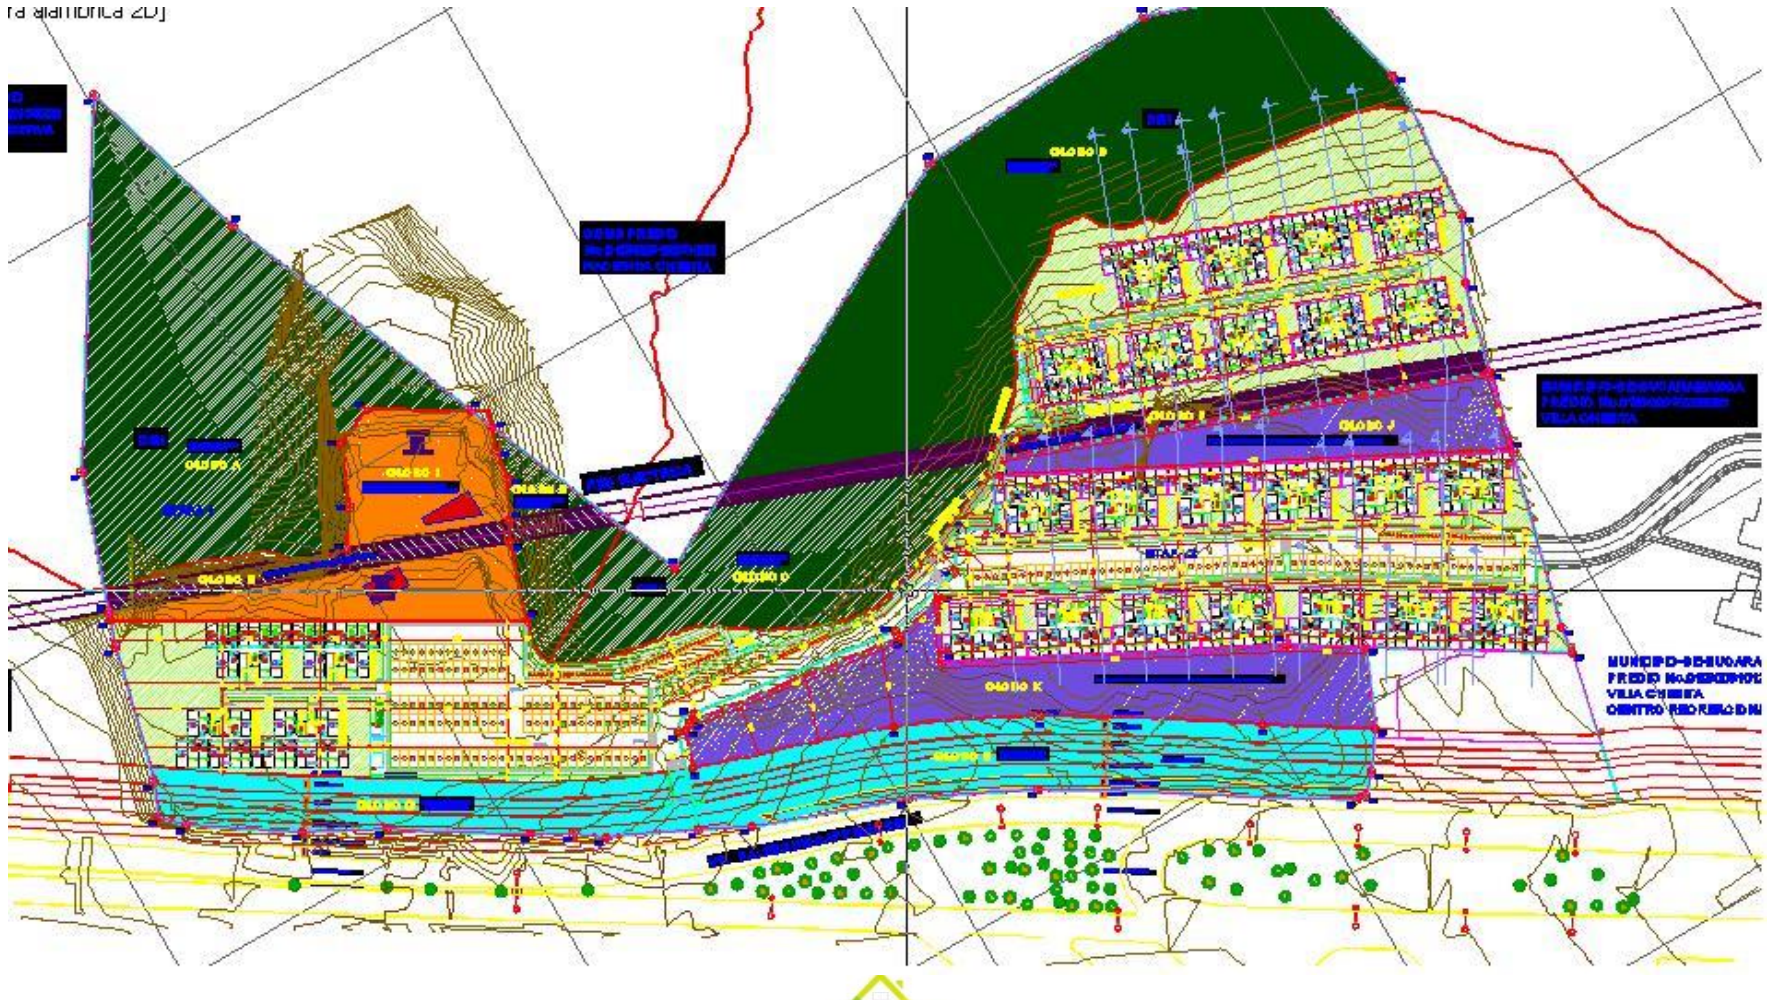

AVANCES

PROYECTO VIP LA
INMACULADA

45,15%

CONSTRUCCION DE OBRAS DE
ALCANTARILLADO PARA EL PROYECTO DE
VIVIENDA LA INMACULADA
(CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No
132/11)
VALOR CONVENIO: \$ 1.639.295.057
EJECUCIÓN: 41,30 %

41,30%

CONSTRUCCIÓN DE LA RED EXTERNA PARA
EL PROYECTO DE VIVIENDA LA INMACULADA
VIP (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No
125/13)
VALOR CONVENIO: \$ 3.085.242.880
EJECUCIÓN: 17,18 %

17,18%

VIVIENDAS

810 UNIDADES INICIALMENTE PROYECTADAS
812 UNIDADES DEFINITIVAS AREA



Registro fotográfico



PROYECTO NORTE CLUB (ANTIGUO CLUB TIBURONES) VIVIENDA PARA AHORRADORES –VIPA 240 APTOS



A la fecha ya se han postulado 290 familias ya poseemos licencia de urbanismo No. 68001-2-12-0298 de la curaduría urbana No. 2. Y actualmente estamos a la espera de la licencia de construcción. El lote fue entregado a Comfenalco y ya dio inicio al movimiento de tierra.



Valor de Inversión
\$ 9.903.600.000

FAMILIAS
POSTULADAS 290

ENTREGA TOTAL
JUNIO 2015
240 VIP

PROYECTO INTRADOMICILIARIAS



Según el avance de obra entregado por el Contratista y corroborado por la Interventoría del programa, las viviendas intervenidas a la fecha son:

BARRIO MARIA PAZ

Viviendas Potenciales: 229

Viviendas Visitadas: 612

Diagnósticos aprobados: 252

Red Unidos: 66

Viviendas intervenidas: 241 / Valor: \$640.488.393,00

Viviendas entregadas: 225. Las otras no se han entregado por ausencia de los beneficiarios, pero las obras ya están terminadas en este barrio.



BARRIO RINCON DE LA PAZ

Viviendas Potenciales: 84

Viviendas Visitadas: 196

Diagnósticos aprobados: 45 / Valor: \$145.995.529,00

Red Unidos: 17

Viviendas intervenidas: 40 con porcentaje de ejecución del 70%

Viviendas entregadas: 9

PROYECTO INTRADOMICILIARIAS



BARRIO CRISTAL BAJO:

Viviendas Potenciales: 96

Viviendas Visitadas: 325

Diagnósticos aprobados: 66 / Valor: \$169.098.948,00

Red Unidos: 25

Viviendas intervenidas: 30 con porcentaje de ejecución del 65%

Viviendas entregadas: 0

BARRIO VILLA MARIA:

Viviendas Potenciales: 21

Viviendas Visitadas: 35

Diagnósticos aprobados: 21 / Valor: \$54.774.878,00

Red Unidos: 5

Viviendas intervenidas: 21 con porcentaje de ejecución del 70%

Viviendas entregadas: 0

BARRIO ALTOS DEL PROGRESO:

Viviendas Potenciales: 112

Viviendas Visitadas: 197

Diagnósticos aprobados: 44 / Valor: \$101.097.150,00

Red Unidos: 8

Viviendas intervenidas: 21 porcentaje de ejecución del 70%

Viviendas entregadas: 0

BARRIO PAISAJES DEL NORTE:

Viviendas Potenciales: 37.

No se ha iniciado fase de diagnósticos hasta verificar resultados del balance real de ejecución de obra.

VALOR TOTAL COMPROMETIDO EN FASE 1
(DIAGNOSTICOS) Y FASE 2 (EJECUCION):
\$1.066.177.300,00

VALOR TOTAL DE LAS 234 VIVIENDAS
ENTREGADAS: \$626.766.617,00

EL PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA ES DEL
38,50%

Los anteriores datos corresponden a la última
actualización de información del día 9 de septiembre
entregada por la Interventoría

CONVENIO INVISBU – PNUD PARA OBSERVATORIO DE HABITAT Y POLITICA PÚBLICA DE HABITAT



Actualmente en etapa de diseño de la pagina web del observatorio de Hábitat del Municipio de Bucaramanga

Recopilación de información para los indicadores del observatorio de vivienda.

Ha culminado al 100 por ciento la etapa de revisión técnica de las líneas estratégicas de la Política Publica de Hábitat del Municipio y se procede a la socialización de la misma.

Una vez realizada la socialización se procederá a la depuración de líneas estratégicas y redacción del documento borrador final de la Política Publica.

Gestión Financiera


Ejecución Presupuesto de Ingresos a Septiembre 30 de 2014

NOMBRE	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014	PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADO SEPTIEMBRE 30 DE 2014	% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS			
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	195,500,000	193,012,256	98.72%
TRANSFERENCIAS Y APORTES	20,903,324,148	12,760,000,000	61.04%
OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES Y DEPARTAMENTALES	2,000,000	0	0%
OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	20,901,324,148	12,760,000,000	61,04%
RECURSOS DE CAPITAL	20,299,136,543	20,290,365,559	100%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	41,397,960,691	33,243,377,815	80,30%

Gestión Financiera

Ejecución Presupuesto de Gastos a Septiembre 30 de 2014

NOMBRE	PRESUPUESTO DE GASTOS 2014	PRESUPUESTO DE GASTO EJECUTADO A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE GASTOS			
FUNCIONAMIENTO	2,761,049,542	1,876,541,729	67.96%
GASTOS DE PERSONAL	1,840,799,000	1,333,758,347	72.45%
GASTOS GENERALES	633,050,542	386,504,364	61.05%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	287,200,000	156,279,018	54.41%
PRESUPUESTO DE SERVICIO A LA DEUDA	0	0	0
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	38,636,911,149	32,847,716,457	85.01%
SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE	4,639,205,013	4,639,205,013	100%
SECTOR VIVIENDA	33,997,706,136	26,704,262,813	78.54%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	41,397,960,691	33,220,009,555	80.24%

		INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA "INVISBU"		F: 01.FO.GF
				Versión: 0.4
		BALANCE GENERAL AGOSTO 31 DE 2014		Fecha: 29.06.12
CODIGO	ACTIVO	CODIGO	PASIVO	
	CORRIENTE		CORRIENTE	10.601.804.546
11	Efectivo	24	Cuentas por pagar	10.285.253.971
1105	CAJA	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	9.352.870.732
1110	Bancos y corporaciones	2425	Acreedores	147.866.690
111005	Cuentas Corrientes	2430	Subsidios asignados	777.717.757
111006	Cuentas de Ahorro	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	6.798.792
111090	Otros Depósitos en Instituciones Financieras			
		25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	7.271.582
12	Inversiones	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	7.271.582
1201	Admon. de Liquidez			
1207	Inversiones Patrimoniales	27	Pasivos estimados	309.278.993
		2710	Provisión para contingencias	65.456.933
14	Deudores	2715	Provisión para prestaciones sociales	243.822.060
1406	Venta de bienes			
1413	Transferencias por cobrar		PATRIMONIO	29.491.926.445
1420	Avance y anticipos entregados	32	Patrimonio Institucional	29.491.926.445
1470	Otros deudores	3208	Capital fiscal	10.736.981.637
	NO CORRIENTE	3230	Resultados del ejercicio	9.850.547.844
		3235	Superavit por Donación	7.218.733.965
16	Propiedades, planta y equipo	3240	Superavit por Valorización	2.093.308.419
1605	Terrenos	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	407.645.420
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40.093.730.991
1670	Equipos de comunicación y computación			
1675	Equipos de transporte, tracción y elevac.			
1685	Depreciación acumulada	83	Deudoras de Control (Db)	4.661.261.638
19	Otros Activos	89	Deudoras por Contra (Cr)	4.661.261.638
1905	Gastos pagados por anticipados	91	Responsabilidades contingentes (Cr)	3.183.490.108
1910	Cargos Diferidos	93	Acreedoras de Control (Cr)	1.110.888.705
1970	Intangibles	99	Acreedora por Contra (Db)	4.294.378.813
1999	Valorizaciones			
	TOTAL ACTIVO			
	40.093.730.991			
 SILVIA JOHANNA CAMARGO GUTIERREZ Directora		 CARLOS ARENAS MURILLO Subdirector Administ. Y Finanz. (E)		 MARITZA GOMEZ MARTINEZ Profesional Universitario Grado Dos-Contador Publico

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL de enero a 31 de agosto de 2014



INVISBU
Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga

INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA

F: 01.PO.GF

Versión: 0.4


Fecha: 29.06.12

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

AGOSTO 31 DEL 2014

COD.	CUENTAS	VALOR
	INGRESOS	14.819.912.925
44	Transferencias	12.760.000.000
4428	Otras Transferencias	12.760.000.000
48	OTROS INGRESOS	2.059.912.925
4805	Financieros	348.981.560
4810	Extraordinarios	161.996.820
4815	Ajuste ejercicios años anteriores	1.548.934.545
	GASTOS	4.969.365.081
51	De Administración	1.619.141.695
5101	Sueldos y Salarios	1.015.503.612
5103	Contribuciones Efectivas	170.081.575
5104	Aportes sobre la Nomina	39.640.500
5111	Generales	387.820.680
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	6.095.328
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	52.185.773
5314	provision para contingencias	52.185.773
55	Gasto Público Social	3.282.984.648
5504	Vivienda	3.282.984.648
58	Otros Gastos	15.052.965
5802	Comisiones	95.004
5805	Financieros	12.384.101
5810	Extraordinarios	15.460
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	2.558.400
	SUPRAVIT DEL EJERCICIO	9.850.547.844


SILVIA JOHANNA CAMARGO G
Directora


CARLOS ARENAS MURILLO
Supervisor Administrativo y Financiero (E)


MARITZA GOMEZ MARTINEZ
Profesional Universitario Grado Dos
Contador Publico

Gestión Jurídica de Enero a Septiembre 2014

	Cantidad del periodo
Atención comunidad temas jurídicos	799
Inscripción personería jurídica	123
Certificados de existencia y representación legal	1072
Radicación de documentos proyectos de vivienda urbana	72
Registro constructor	64
Levantamiento de hipoteca	15
Acciones Populares en Trámite	17
Acciones Populares Ejecutadas	17
Acciones de Tutelas	89
Derechos de Petición	46
Acciones de Repetición	2
Acciones de Grupo	2
Reubicaciones	2
Acciones de Nulidad y Restablecimiento	1
Acciones Contractuales	16
Procesos Ejecutivos a favor del INVISBU	32
Procesos Ejecutivos en contra del INVISBU	0

MODALIDAD	TIPO DE CONTRATO	ND NUMERO DE CONTRATO	VALOR TOTAL EN PESOS
CONTRATACIÓN DIRECTA	(PSP Y PSA) Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo Adicionales	Doscientos Cinco (205)	\$ 2.899.796.666
		Adicionales : Ciento Uno (101)	\$ 5.070.954.578 Total: \$ 7.970.751.244
CONTRATOS MINIMA CUANTIA	SUMINISTRO, INTERVECTORIAS, COMPRA.	Diez y Seis (16)	\$ 136.094.721
CONTRATOS DE LICITACION PUBLICA	CONSTRUCCION, VIGILANCIA	Seis (06)	\$ 109.925.738.227
CONTRATO DE CONCURSO DE MERITOS	PROYECTO ALTOS DE BETANIA , INTERVENTORIA CLAVERIANO, LONJA INMOBILIARIA	Tres (03)	\$ 71.104.894.989
Selecciones Abreviadas	CORPORACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL , ESTRUCTURAS METALICAS RICARDO PALACIOS SAS, ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA, CONSORCIO CLAVERIANO	Cuatro (4)	\$ 22.338.267.138
UNION TEMPORALES	COMFENALCO	DOS(2)	\$ 0.
FIDUCIA MERCANTIL	ND	ND	ND

Gestión Plan de Desarrollo

PROGRAMA .1	SUBPROGRAMAS	METAS		META ACUMULADA DEL CUATRIENIO	% GESTION ACUMULADA DEL CUATRIENIO	% PENDIENTE POR DESARROLLAR	META FISICA PENDIENTE	OBSERVACION
		Metas de Producto	META DEL CUATRIENIO					
VIVIENDA Y HABITAT DIGNO Y SALUDABLE PARA BUCARAMANGA	1. PROMOCION DEL HÁBITAT SOSTENIBLE	Formular 1 política pública de vivienda y hábitat	1	1	100,0	0,0	0	META CUMPLIDA
		Gestionar y asignar 1.743 subsidios para la construcción de vivienda prioritaria para las familias en situación de vulnerabilidad	1743	624	35,8	64,2	1119	Esta meta se cumple con los proyectos campo Madrid y la Inmaculada, qué se encuentran en construcción y otorga 1544 soluciones de vivienda, proyectos que ya cuenta con recursos asignados y con los cuales se logra superar la meta programada para el cuatrienio.
		Entregar 404 viviendas de interes prioritario con subsidios ya asignados	404	270	66,8	33,2	134	Para el cumplimiento de esta meta se encuentra en construcción el proyecto altos de Betania, con los recursos ya asignados y permite la entrega de 300 Apartamentos con los cuales se logra superar el faltante y la meta programada para el cuatrienio.
		Ejecutar 300 mejoramientos de vivienda en la zona rural del municipio	300	234	78,0	22,0	66	El faltante de esta meta, ya cuenta con vigencia futura aprobada y está en proceso de contratación la ejecución de 200 mejoramientos, que permiten superar así la meta programada para el cuatrienio.
		Gestionar y asignar 150 subsidios para la construcción de vivienda rural en sitio propio	150	88	58,7	41,3	62	Se tiene proyectada la construcción de 65 viviendas con recursos asignados en el presupuesto 2015, con lo cual se cumpliría la meta programada para el cuatrienio.
		Formular 2 planes parciales	2	0,50	1,8	98,2	1,5	Se tiene proyectada la finalización estudios con recursos asignados en el presupuesto de 2015
		Formular el plan de vivienda de la administración central y entidades descentralizadas	1	1	100,0	0,0	0	META CUMPLIDA

Gestión Plan de Desarrollo

PROGRAMA .1	SUBPROGRAMAS	METAS		META ACUMULADA DEL CUATRIENIO	% GESTION ACUMULADA DEL CUATRIENIO	% PENDIENTE POR DESARROLLAR	META FISICA PENDIENTE	OBSERVACION
		Metas de Producto	META DEL CUATRIENIO					
VIVIENDA Y HABITAT DIGNO Y SALUDABLE PARA BUCARAMANGA	2. RENOVACION URBANA	Realizar el estudio de viabilidad del proyecto de Renovación Urbana "Parque Comunero".	1	1	100,0	0,0	0	META CUMPLIDA
	3. MEJORAMIENTO INTEGRAL BARRIAL	Registrar 200 Títulos de propiedad	200	228	100,0	0,0	0	META CUMPLIDA
		Beneficiar 1.000 familias con obras de saneamiento básico	1000	1016	101,6	0,0	0	META CUMPLIDA
		Formular 2 planes de mejoramiento Integral barrial	2	1	50,0	50,0	1	Se encuentra en proceso de finalización el plan de mejoramiento pendiente

PROGRAMA .1	SUBPROGRAMAS	METAS		META ACUMULADA DEL CUATRIENIO	% GESTION ACUMULADA DEL CUATRIENIO	% PENDIENTE POR DESARROLLAR	META FISICA PENDIENTE	OBSERVACION
		Metas de Producto	META DEL CUATRIENIO					
POBLACIONES INCLUIDAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE	ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO	Realizar 100 mejoras a viviendas propias a madres cabeza de familia, comunitarias y sustitutas.	100	50	50,0	50,0	50	Esta meta cuenta con recursos de vigencia futura y esta en proceso de contratación
	ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN O CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	Realizar 100 mejoramientos a viviendas propias de personas en situación y/o condición de discapacidad.	100	50	50,0	50,0	50	Esta meta cuenta con recursos de vigencia futura y esta en proceso de contratación
	PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO	Asignar 180 subsidios complementarios para vivienda nueva o usada de la población víctima del conflicto	180	377	100,0	0,0	0	META CUMPLIDA

GESTION GENERAL AL PLAN DE DESARROLLO A SEPTIEMBRE 2014

% GESTION ACUMULADA (2012-2014)	% PENDIENTE POR CUMPLIR DEL PDM
71%	29 %
